ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ЛВЛ В НЯГАНЕ

подлежит корректировке ежемесячно

ID	Task Name	Исполнители	Цена	Оплата, т.р.	Остаток, т.р.
1	**СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА "ЛВЛ" В НЯГАНЕ**			**0,00р.**	**337 686 596,06р.**
2	**Проектирование**			**0,00р.**	**9 800 260,00р.**
10	**Авторский надзор**			**0,00р.**	**0,00р.**
12	**Подготовительный этап - проектирование, подготовка территории, внешний контур корпусов 1, 2, временные здания и сооружения**			**0,00р.**	**76 951 488,69р.**
13	Разработка рабочей документации			0,00р.	1 757 426,00р.
14	**Подготовка территории**			**0,00р.**	**1 999 185,66р.**
20	**Устройство забора**			**0,00р.**	**1 591 175,38р.**
25	**Строительно-монтажные работы**			**0,00р.**	**71 603 701,65р.**
37	**Работы по дополнению к контракту на подготовительный этап работы - обеспечение пуска тепла в корпуса 1,2**			**0,00р.**	**22 352 572,00р.**
44	**Корпус гидротермической обработки**			**0,00р.**	**18 149 808,09р.**
45	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
47	**СМР**			**0,00р.**	**18 149 808,09р.**
54	**Котельная со складом древесных отходов и площадкой временного хранения топлива**			**0,00р.**	**19 420 328,00р.**
55	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
57	**СМР**			**0,00р.**	**19 420 328,00р.**
65	**Эстакада отходов**			**0,00р.**	**4 970 328,35р.**
66	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
68	**СМР**			**0,00р.**	**4 970 328,35р.**
80	**Работы по генеральному контракту по производственным корпусам 1,2**			**0,00р.**	**76 694 609,73р.**
81	**Реконструкция существующих ростверков внутри корпусов**			**0,00р.**	**9 884 031,07р.**
82	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
84	**СМР**			**0,00р.**	**9 884 031,07р.**
89	**Фундаменты под основн. техн. оборуд.**			**0,00р.**	**3 692 145,00р.**
90	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
92	**СМР**			**0,00р.**	**3 692 145,00р.**
97	**Реконструкция (ремонт) металлического каркаса**			**0,00р.**	**2 183 691,00р.**
98	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
100	**СМР**			**0,00р.**	**2 183 691,00р.**
105	**Крановое оборудование**			**0,00р.**	**500 000,00р.**
106	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
108	**СМР**			**0,00р.**	**500 000,00р.**

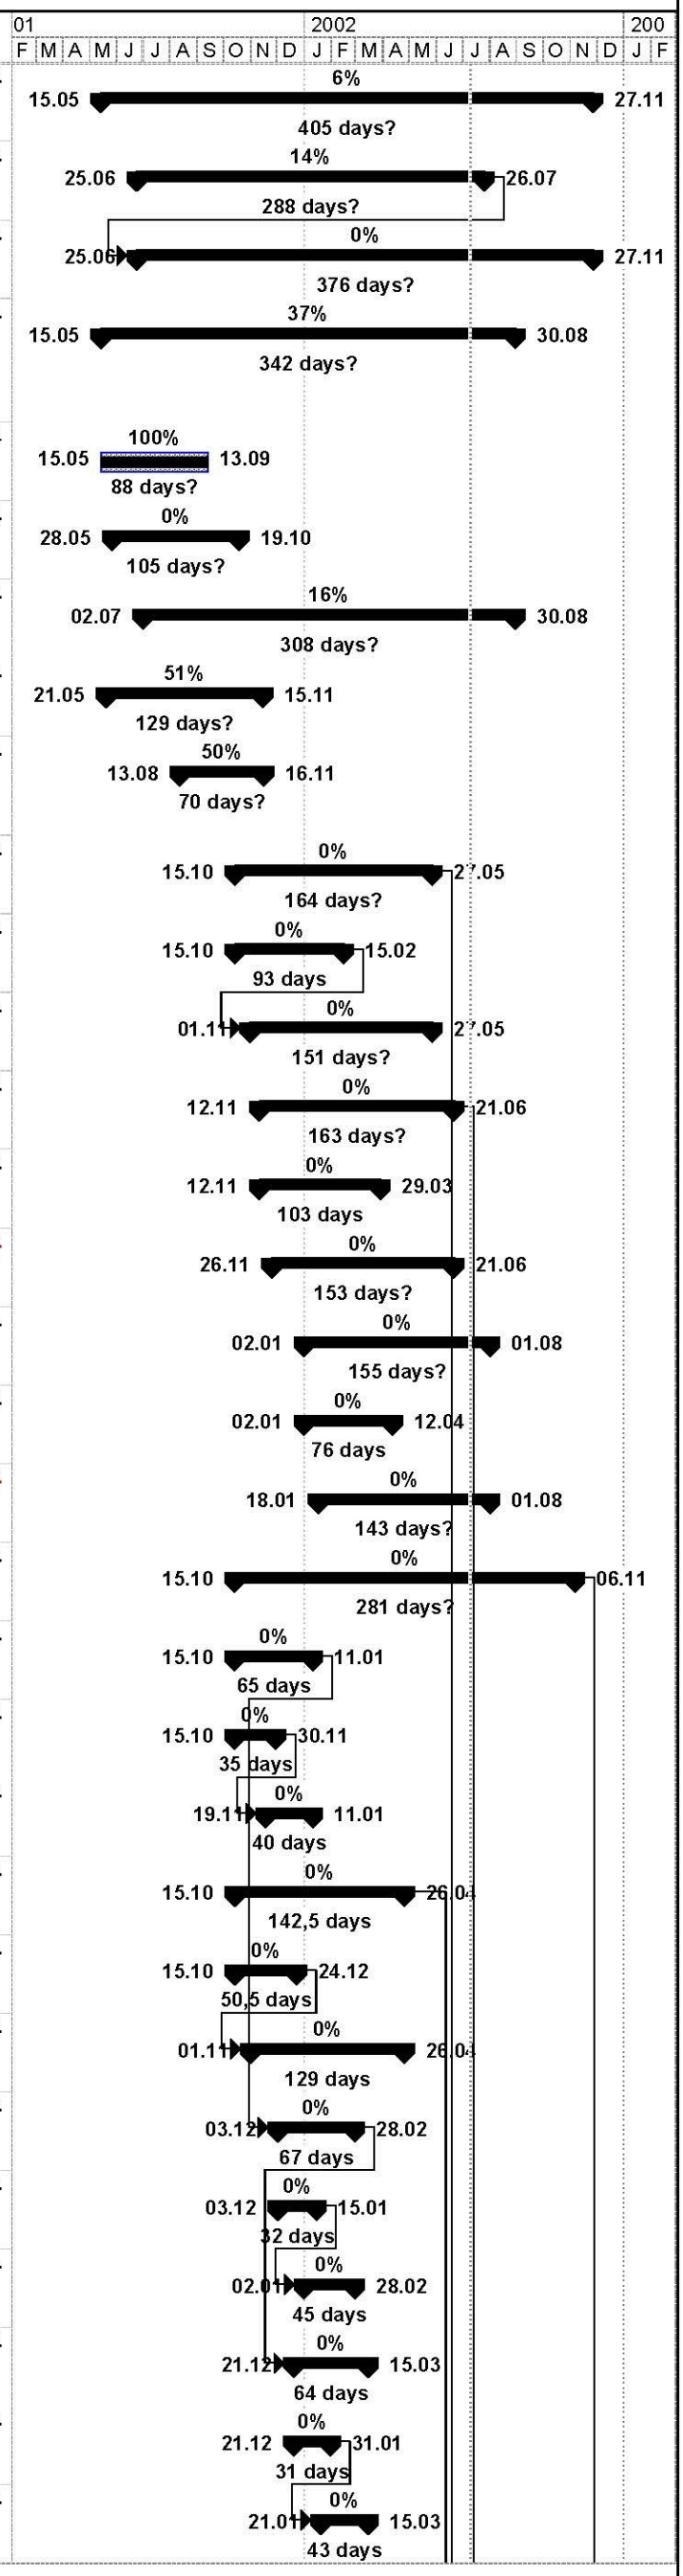

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ЛВЛ В НЯГАНЕ

подлежит корректировке ежемесячно

ID	Task Name	Исполнители	Цена	Оплата, т.р.	Остаток, т.р.
113	Внутренние системы ВиК			0,00р.	6 551 925,00р.
114	ПСД			0,00р.	0,00р.
116	СМР			0,00р.	6 551 925,00р.
120	Трубопроводы термонагрева			0,00р.	0,00р.
121	ПСД			0,00р.	0,00р.
123	СМР			0,00р.	0,00р.
127	Системы вентиляции и дымоудаления			0,00р.	1 500 617,00р.
128	ПСД			0,00р.	0,00р.
130	СМР			0,00р.	1 500 617,00р.
135	Силовое электрооборудование. РП. ТП. Заземление. Освещение по постоянной схеме			0,00р.	3 000 000,00р.
136	ПСД			0,00р.	0,00р.
138	СМР			0,00р.	3 000 000,00р.
143	Компрессорная. Воздухоснабжение			0,00р.	1 500 000,00р.
144	ПСД			0,00р.	0,00р.
146	СМР			0,00р.	1 500 000,00р.
151	Аспирационные системы (воздуходувки, воздуховоды). Пневмотранспорт			0,00р.	1 500 000,00р.
152	ПСД			0,00р.	0,00р.
154	СМР			0,00р.	1 500 000,00р.
159	Устройство полов			0,00р.	22 225 792,00р.
160	ПСД			0,00р.	0,00р.
162	СМР			0,00р.	22 225 792,00р.
167	Встр. помещения и фунд. под вспом. оборуд.			0,00р.	9 231 801,00р.
168	ПСД			0,00р.	0,00р.
170	СМР			0,00р.	9 231 801,00р.
175	Установка дверных заполнений, ворот			0,00р.	911 877,10р.
176	ПСД			0,00р.	0,00р.
178	СМР			0,00р.	911 877,10р.
183	Монтаж оборудования заточного участка и ремонтно-механических мастерских			0,00р.	0,00р.
188	Монтаж нестандартного оборудования			0,00р.	0,00р.
193	Наладка нестандартного оборудования			0,00р.	0,00р.
198	Внутреняя отделка			0,00р.	2 814 858,00р.
199	ПСД			0,00р.	0,00р.

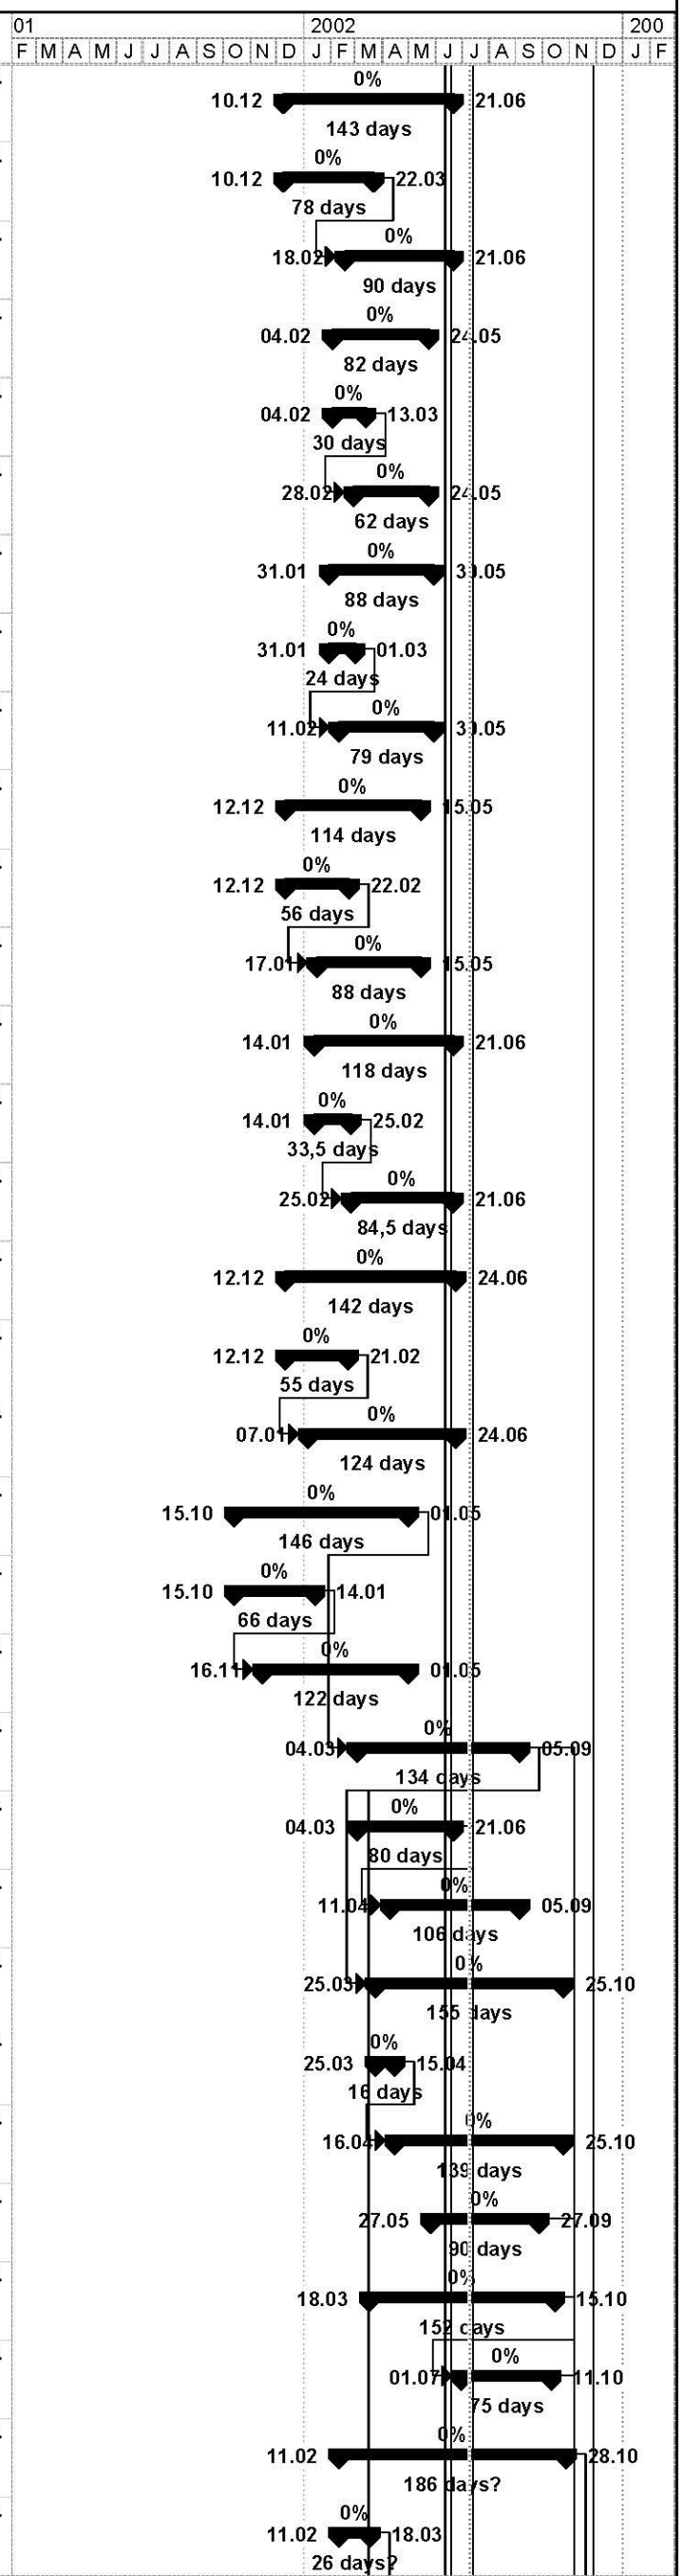

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ЛВЛ В НЯГАНЕ

подлежит корректировке ежемесячно

ID	Task Name	Исполнители	Цена	Оплата, т.р.	Остаток, т.р.
201	**СМР**			**0,00р.**	**2 814 858,00р.**
205	**Поставка технологического оборудования**			**0,00р.**	**0,00р.**
217	**Монтаж и наладка технологического обрудования, в т. ч. обрудования кухни клея - 27.05.02**			**0,00р.**	**11 197 872,56р.**
241	**Рабочая комиссия по производственным корпусам 1, 2. Пакет документации**			**0,00р.**	**0,00р.**
245	Расчет за СМР по производственным корпусам 1, 2			0,00р.	0,00р.
246	**Автоматическое пожаротушение корпусов 1, 2**			**0,00р.**	**1 155 360,00р.**
247	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
249	**СМР**			**0,00р.**	**1 155 360,00р.**
254	**АБК с полным инженерным обеспечением, включая ОПС**			**0,00р.**	**30 854 418,46р.**
255	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
257	**СМР**			**0,00р.**	**30 854 418,46р.**
263	**Столовая с полным инженерным обеспечением, включая ОПС**			**0,00р.**	**8 264 612,93р.**
264	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
266	**СМР**			**0,00р.**	**8 264 612,93р.**
271	**Очистные сооружения ливневых стоков**			**0,00р.**	**3 640 980,00р.**
272	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
274	**СМР**			**0,00р.**	**3 640 980,00р.**
282	**Система сброса промстоков**			**0,00р.**	**3 700 960,00р.**
283	**ТУ на систему промстоков**			**0,00р.**	**0,00р.**
285	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
287	**СМР**			**0,00р.**	**3 700 960,00р.**
294	**Система резервного водоснабжения**			**0,00р.**	**0,00р.**
295	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
297	**СМР**			**0,00р.**	**0,00р.**
305	**Внутриплощадочные и внеплощадочные ВиК**			**0,00р.**	**22 145 000,00р.**
306	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
308	**СМР**			**0,00р.**	**22 145 000,00р.**
313	**Внеплощадочное электроснабжение - ЛЭП 6 КВа**			**0,00р.**	**3 912 960,00р.**
314	**ТУ на внеплощадочное электроснабжение**			**0,00р.**	**0,00р.**
316	**ПСД**			**0,00р.**	**0,00р.**
318	**СМР**			**0,00р.**	**3 912 960,00р.**
325	**Внутриплощадочное электроснабжение. Наружное освещение**			**0,00р.**	**601 840,00р.**

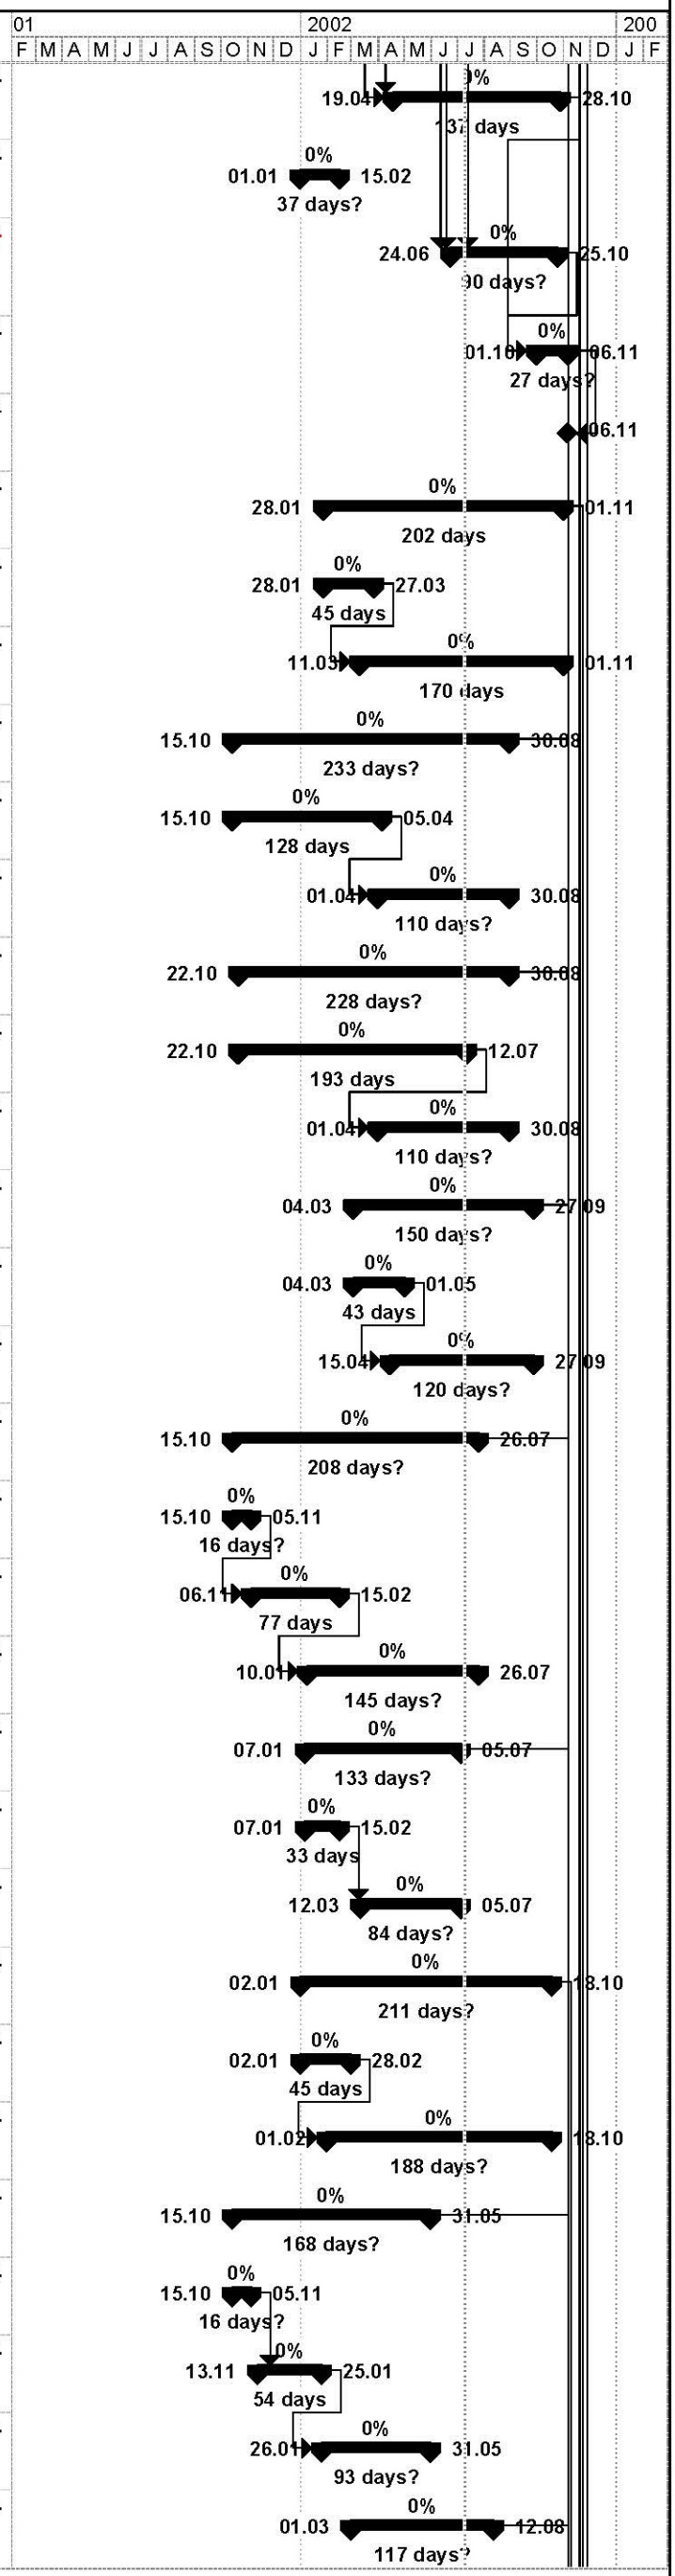

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ЛВЛ В НЯГАНЕ

подлежит корректировке ежемесячно
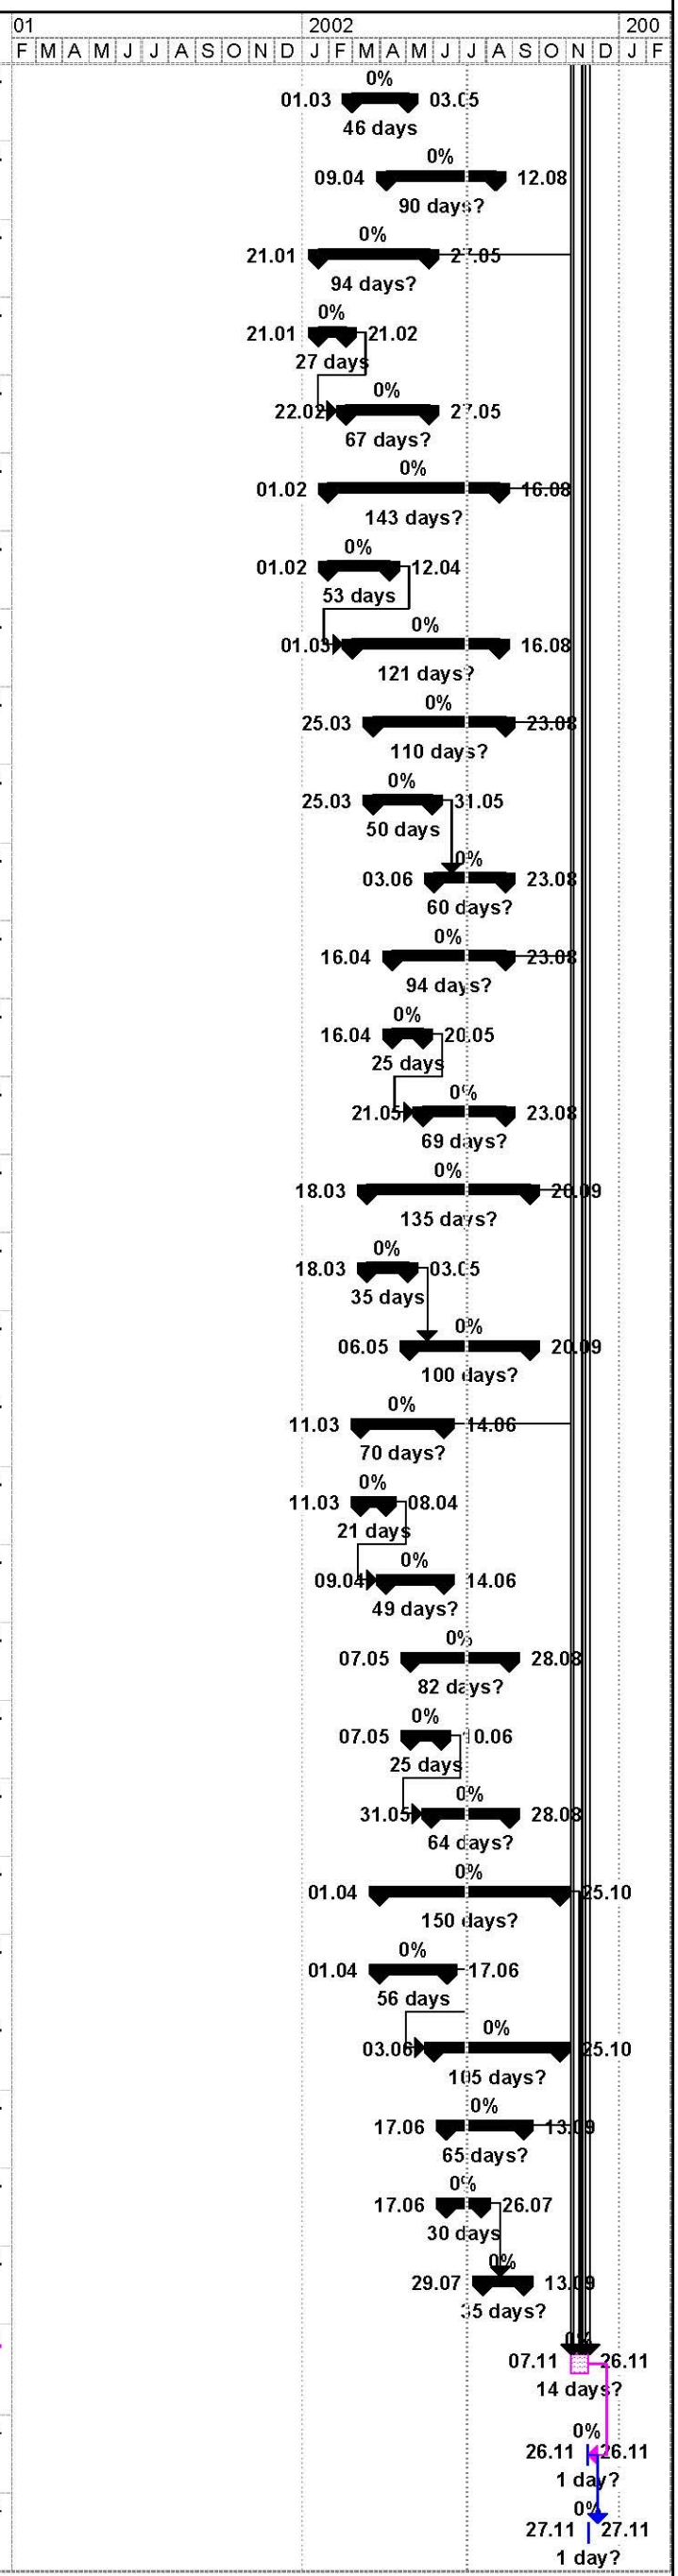
ID	Task Name	Исполнители	Цена	Оплата, т.р.	Остаток, т.р.
326	ПСД			0,00р.	0,00р.
328	СМР			0,00р.	601 840,00р.
335	Газоснабжение от ГРП до стационарной котельной			0,00р.	784 000,00р.
336	ПСД			0,00р.	0,00р.
338	СМР			0,00р.	784 000,00р.
345	Биржа древесины с полным инженерным обеспечением			0,00р.	23 063 069,81р.
346	ПСД			0,00р.	0,00р.
348	СМР			0,00р.	23 063 069,81р.
353	КПП Западный			0,00р.	149 530,00р.
354	ПСД			0,00р.	0,00р.
356	СМР			0,00р.	149 530,00р.
361	КПП ЖД			0,00р.	343 540,00р.
362	ПСД			0,00р.	0,00р.
364	СМР			0,00р.	343 540,00р.
369	Склад ГСМ			0,00р.	94 420,00р.
370	ПСД			0,00р.	0,00р.
372	СМР			0,00р.	94 420,00р.
378	Склад запчастей и материалов			0,00р.	0,00р.
379	ПСД			0,00р.	0,00р.
381	СМР			0,00р.	0,00р.
386	Теплотрасса к складам запчастей и материалов			0,00р.	0,00р.
387	ПСД			0,00р.	0,00р.
389	СМР			0,00р.	0,00р.
395	Благоустройство, автодороги, автостоянки			0,00р.	10 619 000,00р.
396	ПСД			0,00р.	0,00р.
398	СМР			0,00р.	10 619 000,00р.
403	Наружные сети связи			0,00р.	17 510,00р.
404	ПСД			0,00р.	0,00р.
406	СМР			0,00р.	17 510,00р.
412	**Государственная комиссия**			**0,00р.**	**0,00р.**
413	Подписания акта о выполнении генерального контракта			0,00р.	0,00р.
414	Расчет по генеральному контракту			0,00р.	0,00р.
